Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy **Saimaa Villas**

Päällikkö: VM **DEMOVERSIO (Ei tuotantokäyttöön)** **Suunnittelija: VM**

N:O	Selite	Määrä	Yksikkö	Työryhmä	Kesto
+1	Työmaan perustaminen, raivaus ja purku	3 450	m2	2+2	5 pv
2	Maankaivu	800	m3	2 kk	7 pv
+3	Täyttö ja tiivistys	495	m3	kk + 1+2	20 pv
+4	Perusanturat	400	m2	1+2	17 pv
+5	Alapohjat	340	m2	1+1	7 pv
+6	1 krs. ulkoseinäelementit	24	kpl	1+2	6 pv
+7	1 krs. kantavat väliseinät	12	kpl	2+1	5 pv
+8	1 krs. ulkoseinien kiviverhous	235	m2	1+1	37 pv
+9	Välipohjat	300	m2	1+1	13 pv
+10	2 krs. ulkoseinäelementit	25	kpl	2+1	11 pv
+11	Puurakenteinen yläpohja	296	m2	1+1	16 pv
+12	Vesikatto	704	m2	2+1	18 pv
+13	Terassi	340	m2	1+1	12 pv
+14	Ikkunat ja ulko-ovet	84	kpl	1+1	13 pv
+15	Kevyet väliseinät	840	m2	1+1	23 pv
+16	Alakatot	100	m2	2+0	19 pv
+17	Laatoitukset	364	m2	0+2	25 pv
+18	Maalaustyöt	1 960	m2	2+0	59 pv
+19	Parketit	440	m2	2+0	16 pv
+20	Kalusteet, varusteet ja laitteet	180	kpl	2+0	15 pv
21	Loppusiivous	2 500	rm3	0+3	9 pv
+22	Pihatyöt	2 000	m2	1+2	19 pv
+23	Autokatos	80	m2	1+1	16 pv
24	Luovutus	614	m2	1+0	4 pv

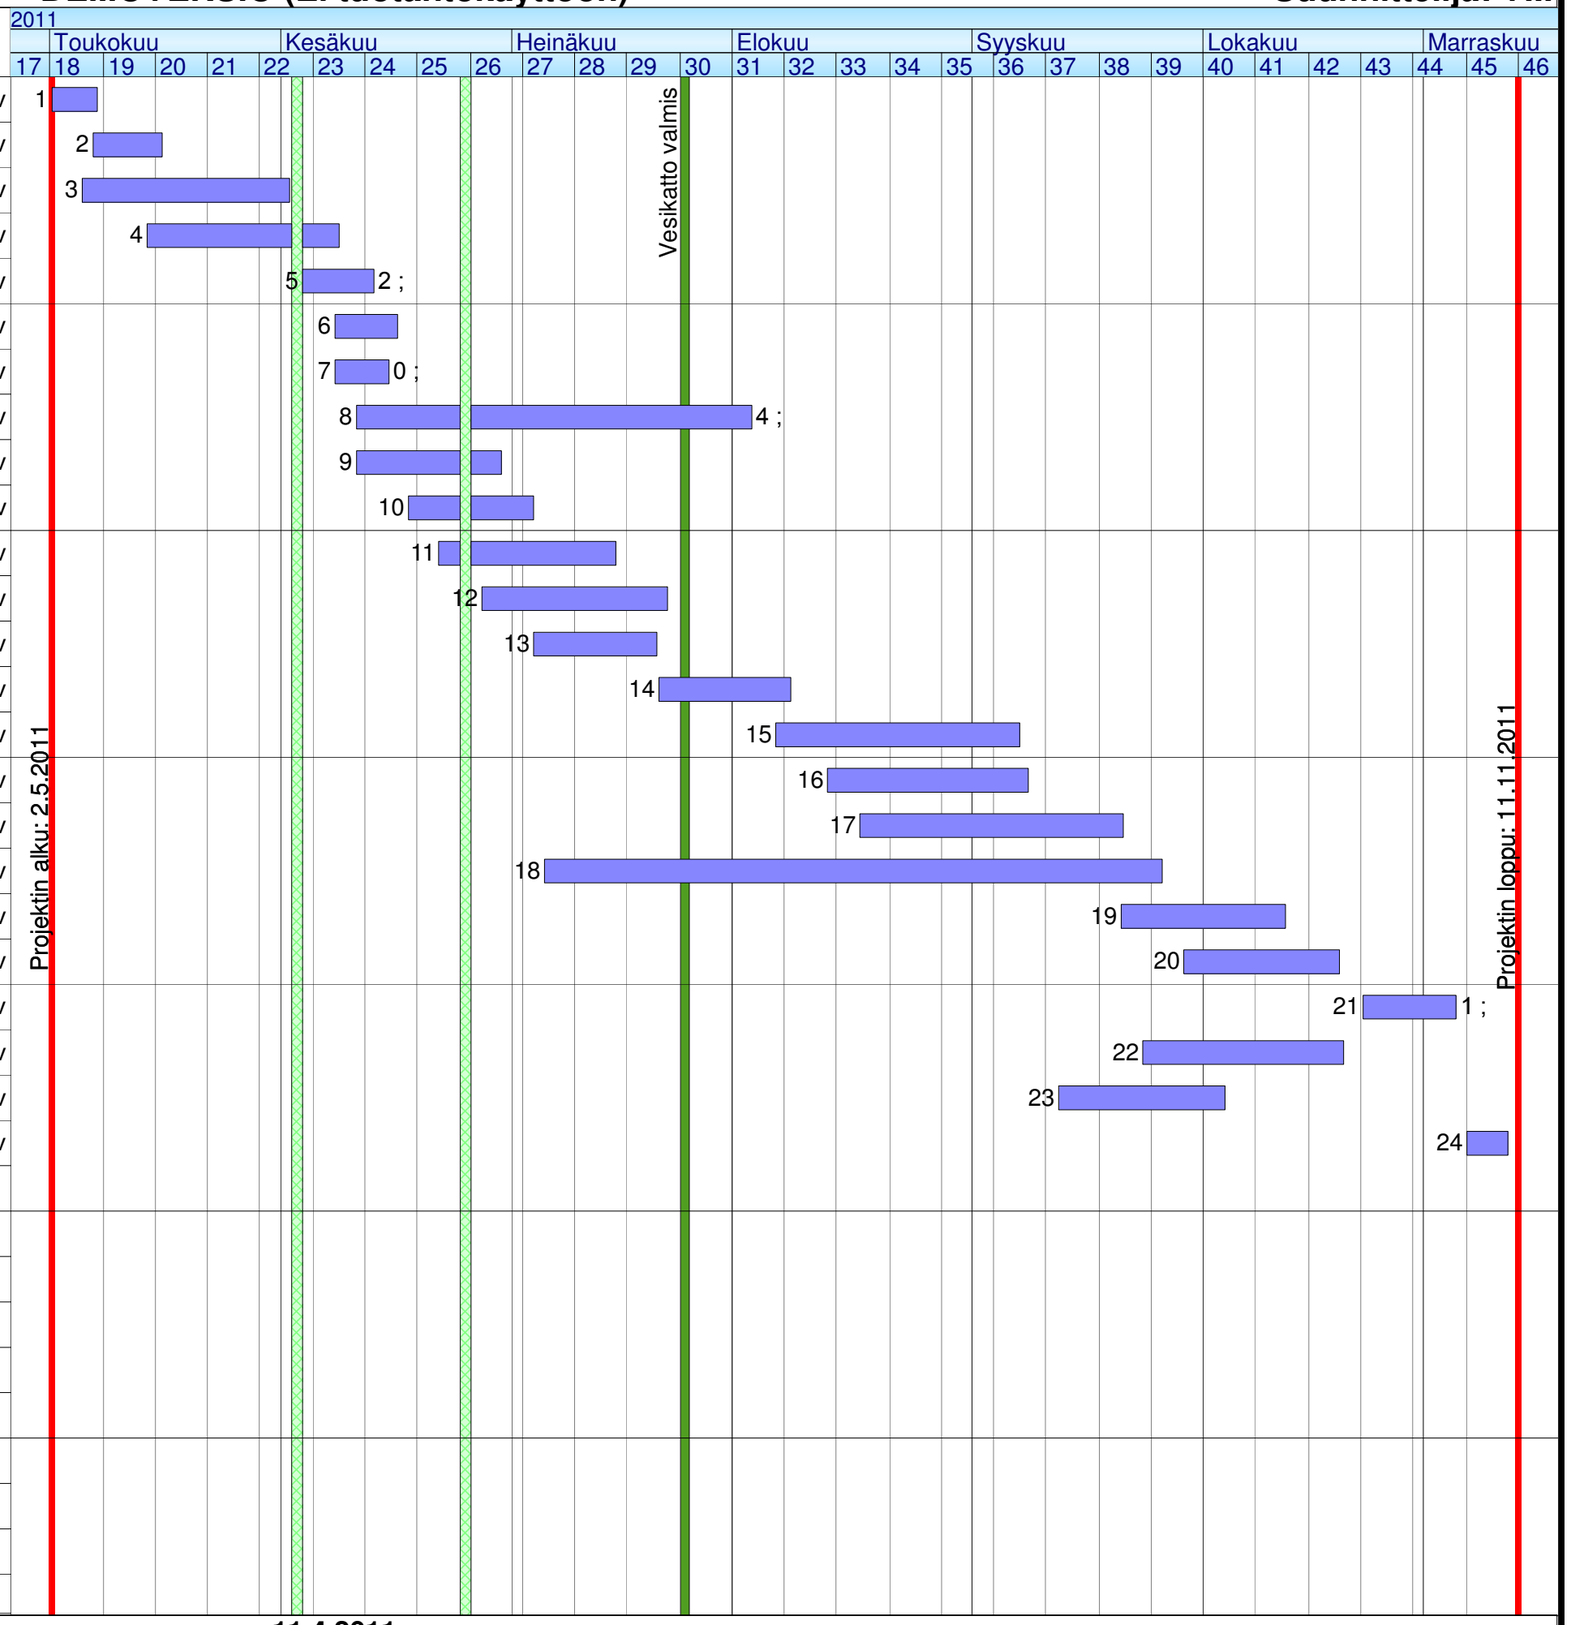

11.4.2011
